

Talk outline

- 1. Background and chronology
- 2. Partnership activities and results
- 3. Lessons and ways forward

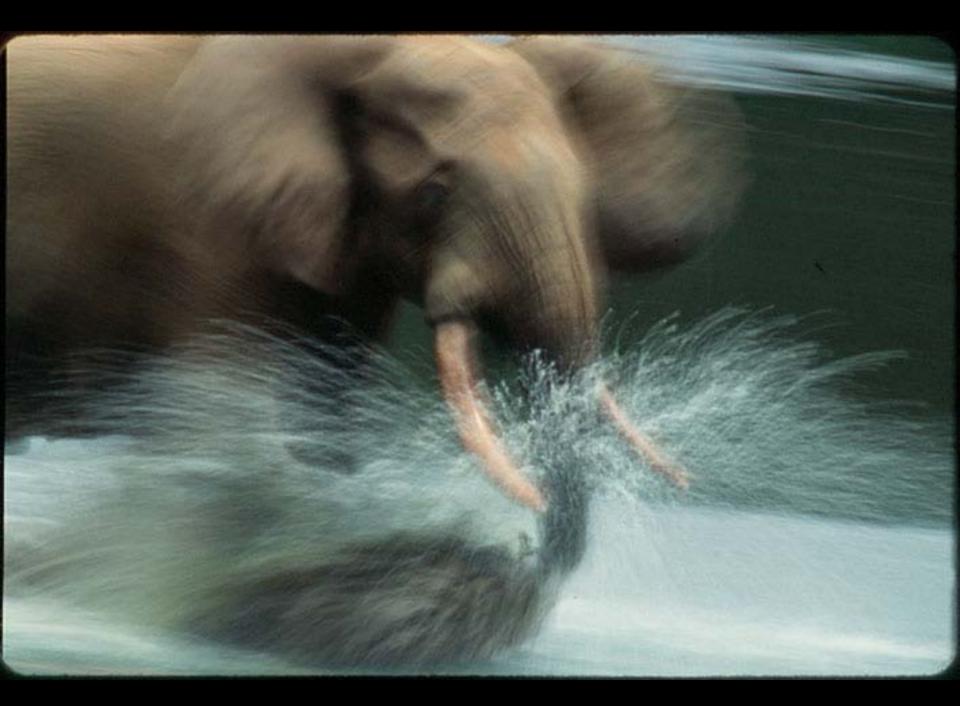
2002 – Gabon creates 13 parks











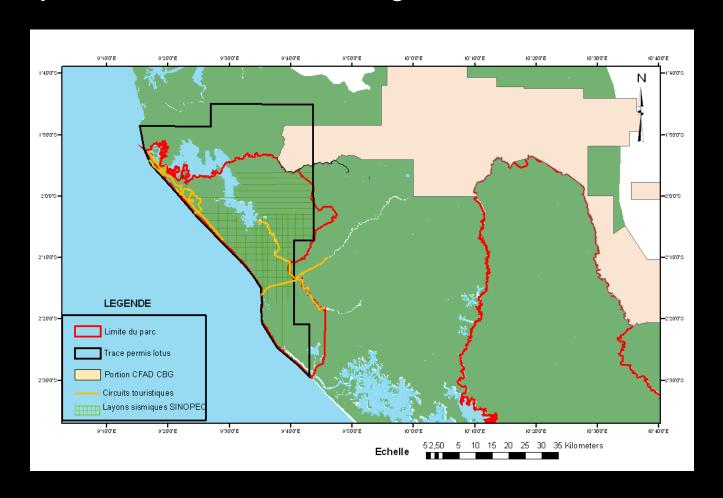




2002 - SCD and WCS launch "Operation Loango" Gabon's first international class ecotourism destination

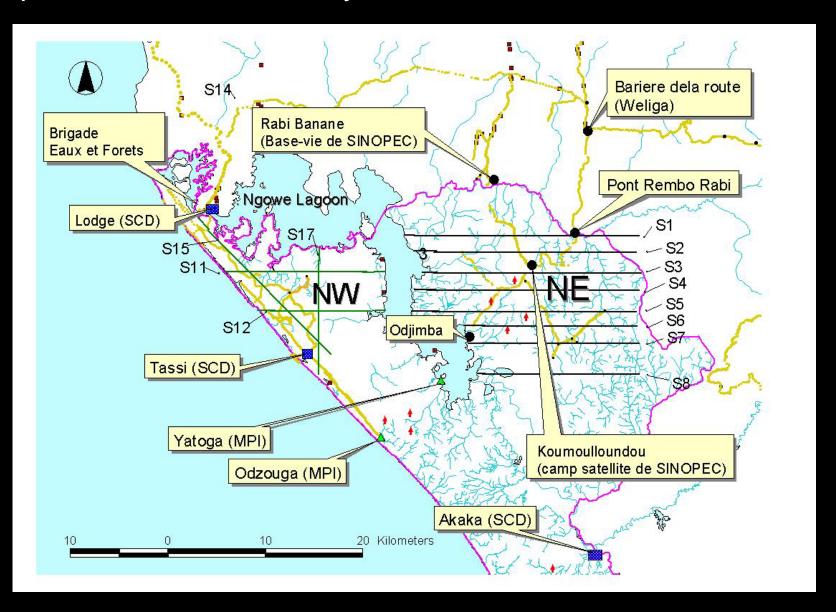


2005 – Gabon grants terrestrial oil concession in Loango NP to subsidiary of Chinese national oil giant SINOPEC



2006 – EIA carried out by Dutch company but not implemented. Local communities, CNPN not consulted

SINOPEC establishes camp in the park, re-opens park roads, imports and hires staff, lays seismic lines...



...clearing trails, laying dynamite and cables, and blasting, all in prime wildlife and tourist areas

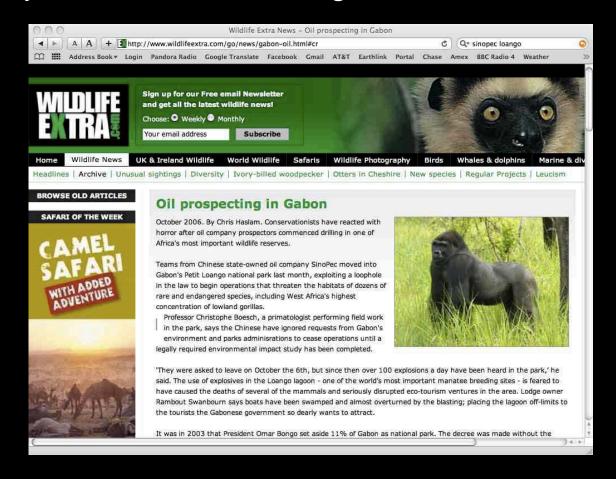








Environmentalists publicize impact of SINOPEC activities on biodiversity and tourism in Loango



SINOPEC responds they were not informed of Loango's status, nor provided guidelines for environmental protection, and acted similarly to other oil companies in Gabon

WCS, WWF, Min. of Environment obtain USFWS funding to work with SINOPEC to establish environmental and social standards in Loango and audit compliance



Team finds unnecessarily wide seismic lines, excessive tree cutting...





SINOPEC staff hunting after work, transporting, and consuming bushmeat including monkeys...



...and other problems

- Seismic explosions on tourist circuits during peak hours
- No effort to minimize camp footprint
- No roadblocks or closure of roads to prevent access
- Litter, poor hygiene, poor staff contracting
- No monitoring of impact on wildlife, habitat, or tourism



2007 - Gabon-WCS-WWF-SINOPEC partnership launched

- Government passes park law establishing ANPN
- ANPN given authority to regulate activities in parks
- Environmental and social protection standards agreed for SINOPEC in Loango
- ANPN asks SINOPEC to accept NGO collaboration
- Audit team moves into SINOPEC camp

WCS's Tomo Nishihara leads WCS-WWF team and begins sensitization of SINOPEC staff



Agreed standards and audit protocols

- Air pollution e.g. vehicle control
- Noise timing of blasts
- Soil erosion camp & road drainage
- Vegetation no new roads, no cutting of trees > 10 cm
- Bushmeat No hunting, import, export; full provisioning
- Wildlife impact Cable removal, pre-blast checks, monitoring
- Staff regulation waste disposal, no alcohol, access control
- Community education, better contracts, monitoring
- Tourism impact coordination, monitoring

Audit matrix

Nº	Composante	Mesures d'attenuation	Exécution		Sulvi		Justification	Cout (en	Páriode	Indices de suívi
			Täche	Responsable	Táche	Responsable	WWW.	millions	retions	
	1. Mobilisation des	équipements et personnel				-	Date as de françaises			
1	Air		escription dans contrat tabrication de panne aux métalliques de limitation de véesse à 40 km/h rappel de limitation de véesse à l'entrée du parc national de Loango et dans les flycampo sensibilisation des chauffeurs à la sécurité roctière	Sous-traitant	Vérification état des pannéaux	Sinopec	Rapport de formation panneaux aux entrées et sorties des villages traversés carnet de registre des évé nements		avant le projet et pendant pour l'état des pannésux	nombre de pannéaux nombre de plaintes nombre d'accidents
2		Bon entreben des véhicules (ien particulier les pots d'échappement) et é quipement selon ui programme pé nodique de contrôle technique/ré paration	visite technique tous les 6000 km	Sous-traitant	Contrôle de réalisation inscrire dans le contrat avec le sous-traitant	Smopec	Rapport de visite technique		durant le projet	carriet de bord de chaque véhicule
3		Bon entretien des véhicules (en particuler les pots d'échappement) et é quipements selon un programme pé nodique de contrôle technique/ré parabon	visite technique tous les 5000 km	Sous-traitant	Coretile de realisation inscrite dans le contrat avec le sous-traitant	Sinopec	Rapport de visite technique		durant le projet	camet de bord de chaque véhicule
4		Informer les habitants de Rabi village, des compennents et villages dans la lagune Iguéta sur le planning des travaux, et de son respect.	embauche interiocuteur sensibilisation des villageois, transmission du chronogramme actualisé aux chefs de villages	Sous-traitant	Sulvi des rencontres	Sinopec	Rapport de consultation		durant le projet	copie du document actualisé transmis aux chefs de village avec calendrier des travaux
5	Erosion du sol	Eviter ou réduire l'utilisation de vé Nicules lourds sur soi de sable blancs	Inscription au contrat: sum des trajets formation à la conduite sur terrain setieux utiliser véhicules légers sauf en phase de motifisation et démobilisation utiliser pixtes existances respecter la vite ser reglementaire dans un PN (30 km/h)	Sous-traitant	Sulvi de la dégradation des sols	Sinopric	Rapport de mission sur les trajets emprurtés		pendant et aprè s le projet	superficie de sol dégrade
6		Surveillance stricte des équipes pour pr évenir le braconnage	sensibilisation des employés à la protection de l'environnement établissement de barrages sur les voies d'entrée du parc panneaux de aignaissation d'accès réservé à Sisopet interdiction d'achat, de transport, de consommation de viande brousse implication des agents de sécurité dans la surveillance interdiction de possession et du transport du matériel de chaisse (fusils, cartouches, chibles métalliques pour le plégeage). Surveillance des cuisines Inscription dans les contrats de sous-traitance de clause "arts-braconnage".	Sous-tratant + Brigade des Eaux et Forets	Sum	Suivi +	Rappart de formation pré- sence de barrage et panneauce et contrat de travail avec les agents de occurité, plan de suivi		avant et durant le projet, la brigade ré alisera le suvi sur 6 mois apré s le projet	Copie des documents transmis Rapport de la brigade des Eaux et Forêts
7	Hygiáne et s à curité	éparer et mettre en œuvre des mesures	Formation hygiene - sécurité adaptée pour tous les employés ; Fourniture de matériel de secours et de premiers soins ; Plan d'urgence d'évacuation médicale ; pour les différents types d'incidents et de blessures qui pourraient survenir ; Test médical pour tous les employés ; Fourniture d'équipement de communication (radios) ; n'accepter que les employés visconés	Sous-traitant	Contrôle	Sinopec	Plan d'urgence et de sé curité, Equipement de sé curité, Equipement de sé curité, Jain d'évacuation médicale d'urgence, rapport médical, plan HSE		avant le projet	plan d'urgence et de sécurité Equipement de sécurité plan d'évacuation médicale d'urgence rapport médical des test réalisés manuel de procédures pour les activités à risques plan HSE
8		Communiquer avec le gestionnaire du parc national de Loango et les villageois sur le calendrier de mobilisation	organiser les rencontres sur site. Transmettre les modifications du calendrier au gestionnaire du PN établi de concert avec Ni	Sous-traitant	Contrible	Sinopes	Papport de séance de travail		avarz et pendant le projet	copie du calendrier modifié
9	Tourisme et recherches scientifiques	quation avec les différents travaux scientifiques et les circuits touristiques	réunion avec responsables et acteurs du parc et mise en place d'un comité de concertation Présentation du calendrier de travail à ce comité	Sous-traitant	Contrôle	Snopec	Prapports de réunion Carte et chronogramme d'activité		avart et pendart le projet	rapport de réunion
10		Ne pas gèner les touristes et les chercheurs ou tout au moins minimister la gène et aussi ne pas leur faire prendre de risques inubles	Transmettre en avance les éventuelles modifications du plan de travail de l'opérateur (voir ci-dessus) aux opérateurs touristiques	Sous-traitant	Contrôle	Seropec	Carte et chronogramme modifiés		pendant le projet	Accusés de réception des documents de modification

Positive results





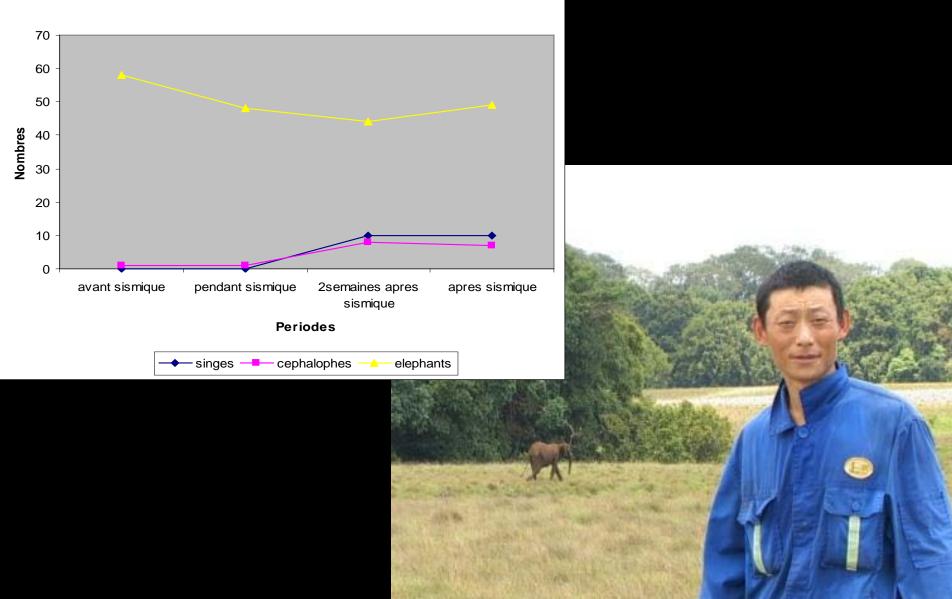






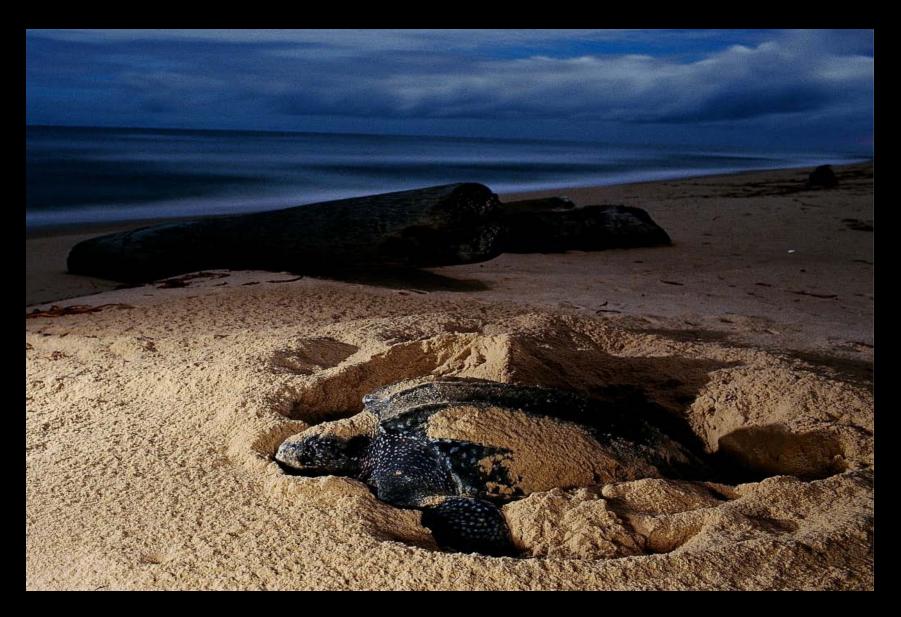


Fig. 2 Nombres de crottes d'elephants, de crotte, d'empreintes, d'observations et de vocalisations de cephalophes, d'observations et de vocalisation de singes identifies





2008 – SINOPEC completes exploration, finding too little oil for terrestrial extraction to be economical at this time



Lessons

- Constructive partnership with Chinese extractive industry is possible
- Civil society pressure & PR works
- Host government support is key
- Engagement with teams on the ground is key

Ways forward

- Strengthen ANPN oversight in all parks
- Bolster civil society, especially local NGOs
- Engage with SINOPEC globally
- Seek further partnerships on the ground
- Support through CBFP, State, USAID, USFWS
